

PRD 01

会议纪要与行动项助手

MVP 需求文档 | 围绕“输入→摘要→行动项→审核→导出”的最短业务闭环设计

文档版本	目标发布	文档 Owner
V1.0	MVP (6 周项目中的 W2 发布)	产品经理 / PMO

编制依据与文档目的

基于《2026 年 AI 需求调研分析与年度立项 PRD》与《2026 年 AI 项目一期计划书》整理。

用于明确会议纪要与行动项助手的 MVP 目标、范围、模块设计、页面要求、规则、接口、验收标准和实施计划，作为设计、开发、测试、UAT 与上线的统一依据。

一页摘要

- 业务目标：**通过最小可用闭环解决当前业务中的高频重复劳动与可视化缺口。
- MVP 原则：**先做规则、流程、模板与透明化，不做大而全能力与高风险自动决策。
- 交付要求：**所有关键动作必须留痕、可回退、可验收，且能嵌入 6 周项目周 Gate 节奏。

纪要出稿时长	行动项抽取准确率	试点用户周活跃率	编辑耗时下降
≤10 分钟	≥80%	≥70%	≥70%

1. 文档信息与业务背景

产品名称	会议纪要与行动项助手
文档版本	V1.0
目标发布	MVP（6周项目中的W2发布）
主要用户	管理者、部门负责人、项目经理、会议组织者
JTBD	当管理者会后需要输出纪要时，希望系统自动形成摘要、责任人与截止时间，以减少整理成本并驱动执行。

1.1 业务问题与目标

- 将会后纪要整理从“手工回忆+二次梳理”改为“自动草稿+人工确认”，缩短出稿时间。
- 把决策、行动项、责任人与截止时间结构化沉淀，形成可追踪的会议台账。
- 复用统一摘要/抽取/导出能力，为后续市场洞察、销售复盘、项目周报等场景沉淀 AI 工作流底座。

1.2 范围与边界

MVP 纳入范围	本期不纳入
支持文本上传，支持录音文件上传（录音转写可接入 ASR，失败时允许人工粘贴转写文本）。	不做跨会议语义搜索与问答。
按照固定模板输出会议摘要、核心结论、决策项、风险项与行动项。	不做自动推送到企业微信/邮件/任务系统。
抽取责任人、截止日期、优先级与置信度；低置信项必须人工确认。	不做复杂说话人分离、声纹识别与发言占比分析。
支持导出 Word/PDF，保留处理日志、版本留痕和会议台账。	不做会议日程系统/日历的实时联动。

1.3 角色与价值诉求

角色	核心诉求
管理者	希望会议结束后 10 分钟内得到可发出的纪要和清晰的待办，而不是依赖秘书手工整理。
项目经理	希望行动项可以直接落入台账，快速知道谁负责、何时完成、哪些内容还需要澄清。
会议组织者	希望不同会议类型能套用模板，减少格式劳动，并且留档可回查。

2. 核心业务流程与应用产品模块设计

2.1 核心业务流程



图 1 业务流程图：以最短闭环实现 MVP 可用性。

2.2 应用产品模块设计

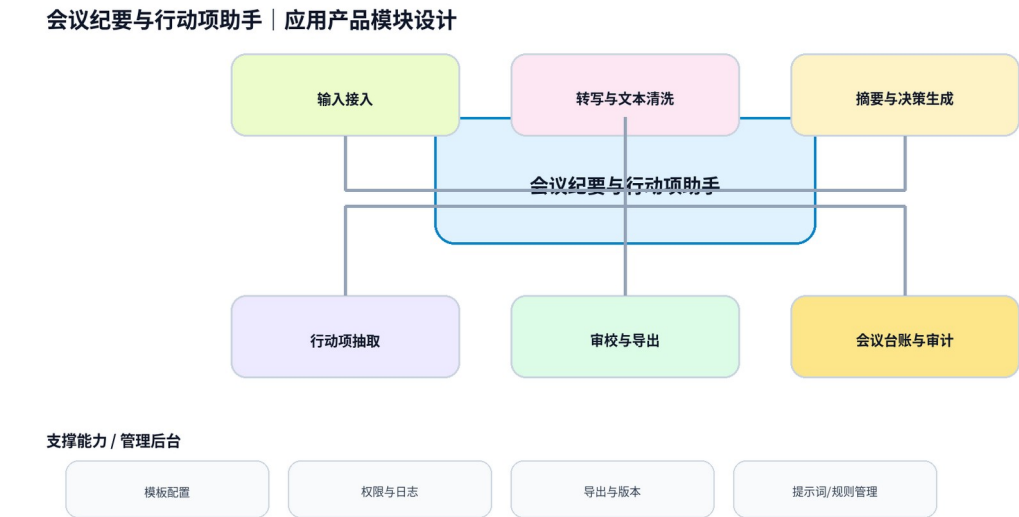


图 2 模块架构图：模块与支撑能力的关系。

2.3 模块清单与规则

模块	核心职责	输入	输出	关键规则 / 异常处理	优先级
输入接入	上传文本/录音；填写会议元数据	会议主题、时间、参会人、会议类型	会议记录对象	文本为空不可提交；录音失败可切文本模式	Must
转写与清洗	对录音做 ASR、去口水词、分段	录音文件 / 转写文本	结构化段落	MVP 不强制说话人识别；保留原文可	Should

				追溯	
摘要生成	按模板生成议题、结论、风险、决策摘要	清洗后文本 + 会议模板	纪要草稿	模板仅覆盖 2-3 类会议	Must
行动项抽取	识别待办、责任人、日期、优先级、置信度	纪要草稿 / 原文片段	行动项列表	低置信项必须人工确认；日期无法确定则留空	Must
审校导出	人工编辑、锁定版本、导出 Word/PDF	纪要草稿	正式纪要与导出记录	未锁定版本不可作为正式稿	Must
台账与审计	沉淀会议列表、操作日志、版本记录	纪要对象 / 操作记录	会议台账	支持按时间/会议类型/组织者筛选	Should

3. 页面与交互设计说明

页面 / 工作台	核心区块	目标用户	关键交互与权限要求
上传与模板选择页	选择会议类型、上传文本/录音、填写会议主题/时间/参会人、启动生成。	会议组织者 / 管理者	模板必选；无转写结果时允许人工粘贴文本。
纪要结果页	展示摘要、决策项、待办表格、置信度和原文片段；支持逐项编辑。	管理者 / PM	低置信项默认高亮，未确认不得直接发布。
导出与台账页	锁定版本、导出 Word/PDF、查看历史版本与处理日志。	会议组织者 / PM	每次导出都生成版本号与导出人记录。

- **交互原则：**所有关键结果都允许人工确认、可回退、可留痕，避免黑盒自动化。
- **状态反馈：**生成中、成功、部分失败、失败等状态必须清晰，且能看到下一步处理动作。
- **权限控制：**仅开放必要角色的操作入口；管理员、业务用户、查看者权限需可区分。

4. 详细需求列表（功能需求）

需求编号	需求点	需求描述	优先级	验收要点
MMT-001	支持文本上传	支持 .docx / .txt / 粘贴文本三种输入方式，记录会议主题、时间、参会人。	P0	上传成功后自动创建会议记录并进入生成流程。

MMT-002	支持录音上传	支持 .mp3 / .wav 上传；如 ASR 服务可用则自动转写，否则提示用户上传转写文本。	P1	转写失败不阻塞文本模式。
MMT-003	会议模板选择	至少提供周会、项目评审、经营复盘 3 类模板。	P0	模板切换后摘要结构变化清晰可见。
MMT-004	摘要生成	生成会议摘要、关键决策、风险提醒和下一步建议。	P0	草稿需在 2 分钟内返回。
MMT-005	行动项抽取	输出责任人、截止时间、优先级与原文依据。	P0	行动项表格可编辑、可新增、可删除。
MMT-006	置信度提示	对责任人/日期识别结果展示高/中/低置信度。	P1	低置信度结果默认需要人工确认。
MMT-007	版本锁定	发布前需执行“锁定版本”；锁定后生成版本号。	P0	锁定后保留草稿与正式稿两份记录。
MMT-008	导出能力	支持导出 Word 和 PDF；导出内容含纪要正文和行动项表。	P0	导出后保留导出时间、导出人和版本号。
MMT-009	会议台账	按会议类型、组织者、时间区间查看历史会议。	P1	支持快速跳转查看导出记录。
MMT-010	审计日志	记录上传、生成、编辑、锁定、导出等行为。	P0	日志至少保留 90 天。

- **MVP 需求判定标准：**是否直接影响业务闭环可用性、核心 KPI 或周 Gate 通过标准。
- **版本扩展原则：**所有 P1/P2 内容统一进入需求池，不在本轮发布中临时插队。

5. 数据对象、接口与非功能要求

5.1 核心数据对象

对象	关键字段	说明
----	------	----

Meeting	meeting_id, title, type, meeting_time, organizer, attendees, source_type	会议主记录
Transcript	transcript_id, meeting_id, source, text, asr_status	转写/原文内容
SummaryBlock	summary_id, meeting_id, section_type, content, confidence	摘要与结论块
ActionItem	action_id, meeting_id, owner, due_date, priority, description, confidence, status	行动项明细
ExportRecord	export_id, meeting_id, version_no, format, operator, exported_at	导出与版本记录

5.2 外部接口与接入方式

接口 / 数据源	内容	必要性	说明
输入来源	本地上传 / 粘贴文本	必选	文本模式必须稳定可用
ASR 服务	第三方或内部转写接口	可选	失败不阻塞，允许手工文本回填
身份认证	企业内部账号体系	必选	用于记录操作者、权限与日志

5.3 非功能、权限与日志要求

- 单次文本生成结果返回时间建议 ≤ 120 秒；大文件录音可进入异步队列。
- 所有原始文本、生成稿、编辑稿均需可追溯，避免会议纪要无法复盘。
- 需要控制访问范围：普通用户仅看自己创建或被授权的会议；管理员可看全量台账。
- 导出文件名称需包含会议主题、日期、版本号，便于归档。

6. 验收标准、实施计划与风险控制

6.1 验收与 KPI 口径

指标	MVP 验收标准
纪要出稿时长	≤10 分钟
行动项抽取准确率	≥80%
试点用户周活跃率	≥70%
编辑耗时下降	≥70%

6.2 实施计划（对应 6 周项目排期）

会议纪要与行动项助手 | MVP 实施时间线



图 3 微实施计划：需求开发、联调、UAT 与上线的时间安排。

阶段任务	时间（周）	工作说明	输出物
范围与模板冻结	W1	会议类型、纪要模板、字段规范	阶段通过物
输入与生成链路	W1-W2	文本上传、草稿生成、结果页	阶段通过物
行动项与导出	W2	抽取逻辑、编辑、Word/PDF 导出	阶段通过物
台账与日志	W2-W3	台账列表、版本记录、审计日志	阶段通过物
UAT 与培训	W3	真实会议试点、模板微调、上线培训	阶段通过物

6.3 风险与降级方案

风险	触发信号	应对策略
录音转写不稳定	录音来源不统一、噪声大	文本模式兜底；转写结果允许人工修订
模板口径不一致	不同部门对纪要格式理解不同	W1 由业务 Owner 冻结模板 v1
抽取准确率不达标	责任人或日期识别偏差大	低置信项强制人工确认；规则+提示词调优

- **上线要求：**必须完成开发自测、UAT 签字、上线 smoke test 与回退预案。
- **数据采集：**上线即开始采集 KPI 基线与稳定性数据，支撑第 2 阶段决策。
